

タスク依存関係マップ

2026-06-07 / ①が決まらないと②が決められない依存チェーンの可視化

■ 完了 ■ 進行中 ■ 未着手（着手待ち） ■ ブロッカー → 依存の向き

⚠ 最優先ブロッカー一覧

タスクID	ブロッカー	ブロックしているタスク	担当	状態
T-003	国際法務弁護士の選定・着手金支払い	→ T-007 / NDA V4	宮脇	未解決
T-107	契約スキーム説明資料（進行中）	→ T-109→T-112→T-116→T-118 / T-117→T-125（計11件）	吉岡＋宮脇	未解決
T-038	国際商標弁理士の選定・契約	→ T-041	宮脇	未解決
社内確定	MOQ数量・契約期間・遅延利息率	→ T-007 弁護士送付	吉岡＋宮脇	未解決

XOP海外原液販売プロジェクト

法務・契約チェーン




商標チェーン



T-038（弁理士選定）が完了すれば T-041 マドリッド出願に即着手可能。


ブランド・ドキュメント（独立着手可）

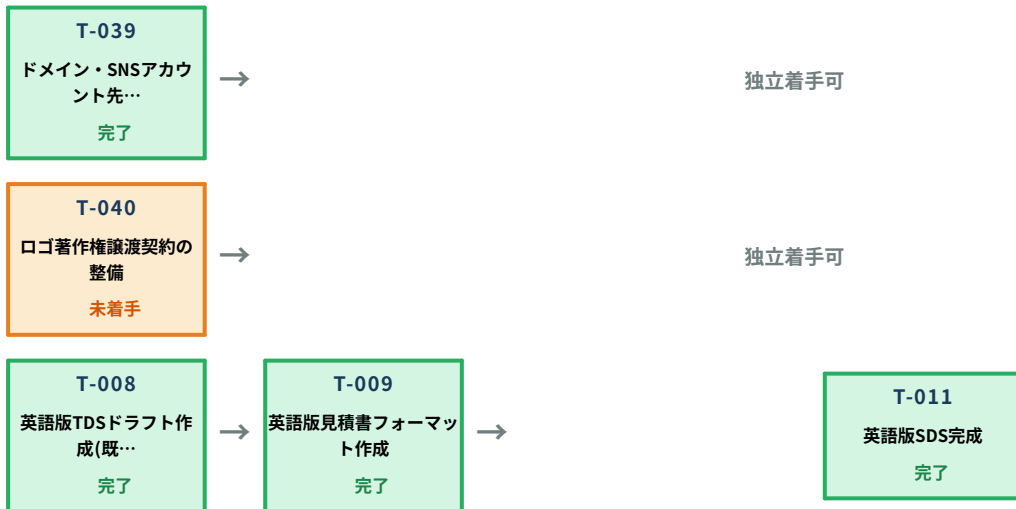

T-039・T-040 は他タスクに依存しない。今すぐ着手できる。

XOP国内代理店プロジェクト

チェーンA 契約・スキーム（5件連鎖）



T-107（進行中）の完成待ちで T-109 以降4件が全停止。T-107 完成 → 社長承認 → T-109 着手 の流れ。

チェーンB 認定制度（8件連鎖 ← T-107解除で全解放）



T-109（代理店契約書ドラフト）が開始されるまでこの8件は手がつけれられない。T-107 → T-109 の解除が最優先。

チェーンC 提案資料（T-104確定済みで今すぐ着手可）



T-104・T-111・T-114 が完了済みのため T-106・T-110 は今すぐ着手できる。

XOP国内販売プロジェクト（テンプレート段階依存）


営業プロセス 7段階 依存構造



T-078（国内方針決め・進行中）の確定後、①②から着手可能。テンプレートは段階をまたいで並行作成OK。

海軍・防衛関連プロジェクト

基盤整備 → 運用ルール



T-049（機密保持ルール）確定までNocoDB等クラウドツールへの機密情報登録可否が不明。プロジェクト全体の情報管理に影響。

建築・建設プロジェクト

許認可 → 受注活動



T-056 は独立して今すぐ着手可能。建設業許可の有無は他案件にも波及する可能性あり。

ブロッカー解除ロードマップ（優先順）

優先	解除タスク	解除後に動き出す件数	担当
最優先	T-003 弁護士選定	T-007・NDA V4	宮脇
最優先	T-107 契約スキーム説明資料 完成	T-109～T-118（契約4件）+T-117～T-125（認定7件）= 11件	吉岡+宮脇
高優先	T-038 弁理士選定	T-041（商標出願）	宮脇
高優先	MOQ・契約期間・遅延利息率の社内決定	T-007 弁護士送付可能に	吉岡+宮脇
今すぐ可	（ブロッカーなし）	T-039・T-040・T-056・T-048・T-106・T-110・T-079～T-083	各担当
